


DIY クラブ施工報告#002-20040725

かねてご要望の掲示板改善につき、コルクボードを上から張り込む方法で施工いたしました（メンバー 12 名参加）。

- 使用材料：アイリスオーヤマ コルクボード C069
 サイズ：縦 600 × 横 900 × 厚さ 16mm
 主要材質：コルク、プリント紙化粧繊維板（MDF）
 販売価格（税込）¥1,410（アイリスプラザ価格）
- 添付マップに示す 1 ～ 5 番館の階段番号（#1-#19）については、既存の掲示板の上に、ビスで止める方法で設置した。不具合ある場合は、再度取替が可能。（予備に 2 枚を残す）
- 集会所，6，7 番館横の 3 カ所（ガラス扉ケース入り）については、コルクボードの枠を外して、ボードそのものをサイズに合わせて切断し、接着剤で上から貼り込んだ。不具合ある場合でも、取替は不可、次回は下地ごと交換することになる。
- 材料調達：コルクボードと若干の工具は事前に購入した。使用した接着剤、シール材、ピンなどは事後に精算予定。
- #14 は事前の試験施工で、止めビスが少ない。#9 は最初の取り付けで割れが生じたため再設置した。
- ガラスケースの掲示板は、いずれも不具合がある。集会所横のガラス扉は上部の部材が無くなっており、施錠しないとはずれてしまう状態。7 番館横は水が入っていたようで、ボードが傷んでいた（上にボードを貼ったので、しばらくは使用できるだろう）。
- 施工順は、番館順で、4 → 2 → 1 → 3 → 5，集会所 → 6 番横 → 7 番横の順序だった。



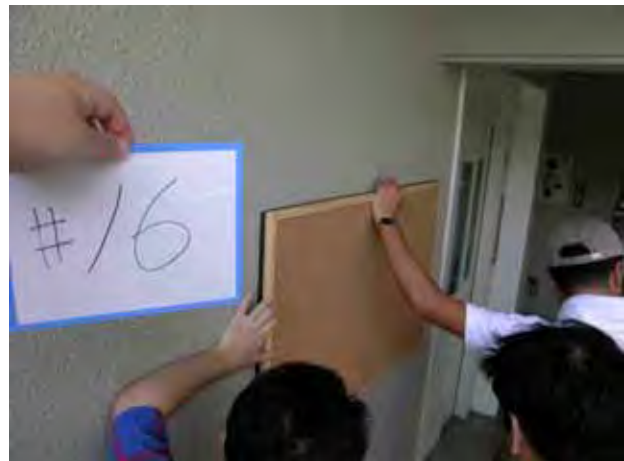





カッティングはカッターで出来た．
スケールは購入したもの



接着剤は村松さん持参のプロ用品．
接着剤用のガンは，村松さん愛用品．



仮止めピンは接着剤固化
後に取り去る予定



下辺には水侵入を予見し
て，シール材を施工した．

奏野南が丘もくせい西住宅 配置図

