

## DIY クラブ施工報告#011-20041031

集会所に設置されたプロジェクタおよびそのためのオーディオラックの配線整理を実施した。また、4番館木村邸の玄関扉補修を実施し、補修に成功した。プロジェクタへの暖房風よけ設置については、材料の調達のみ実施した。午前9時に開始して、12時半には終了した。

- 参加者：野島，菊地，村松，山口，伊與田，大瀧，米満，吉牟田，深町（メンバー等8名参加）。
- ケーブル整理（運用を考慮して、テーブルタップは収納してしまってOn/Offさせないこととした）を実施し、太いケーブルモール（別途購入した）を使って設置した。1本でぎりぎり収まった。これに関する設置作業はこれで完了した。



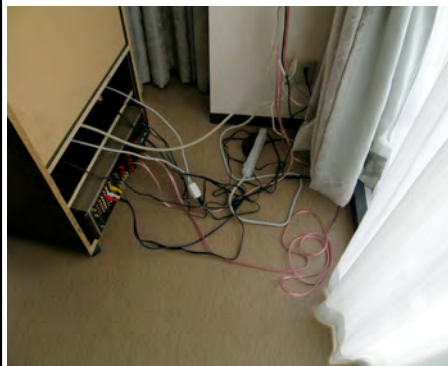


写真1：モール施工前の状態（上）

写真2,3：配線整理とモール設置後（右）

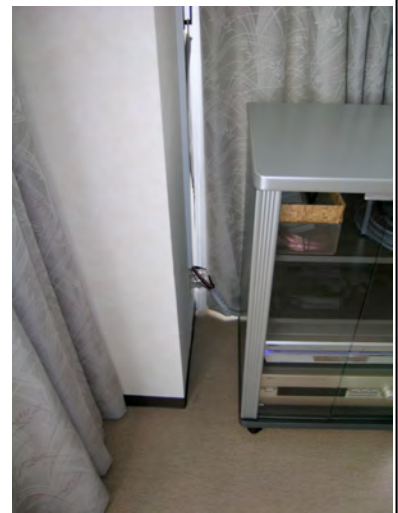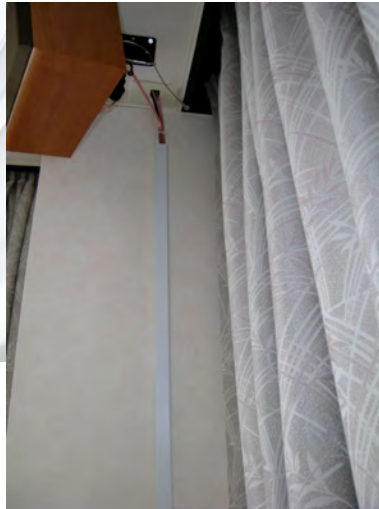

- プロジェクタへの暖房風よけ設置について、プロジェクタの取り付け金具の支柱へ設置する方法を現場で考案し、これに必要な金具やケーブル、アクリル板などをカインズホームにて購入した。調達に手間取ったので設置は次回とした。
- 玄関扉補修については、玄関先での作業を避けて、取り外した扉を集会所へ運んで実施した。分解して（写真4）、一部破損していた部材を金属加工の要領で補修して、再組み立てすることで、概ね使用に支障の無い状態にした。ロック位置の調整も範囲内で実施出来た。

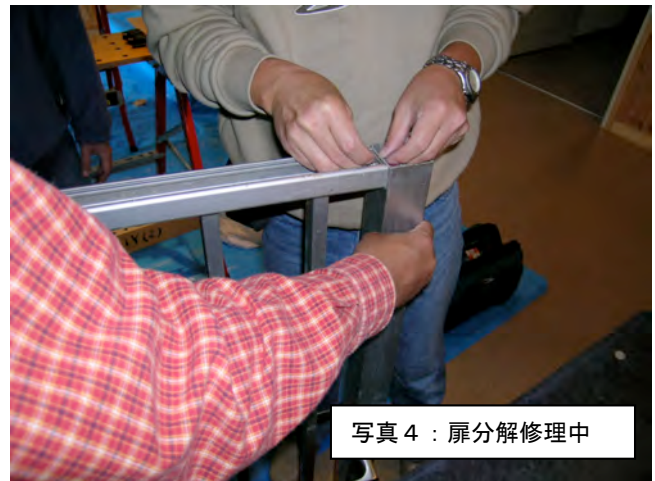


写真4：扉分解修理中

## 10/31のその他の活動

台風による掲示板／コルク部分の膨らみなどが報告されており、管理人のチェックに基づいて現状を確認した。（次ページ写真6-8参照）

## 今までの活動実績：

| No | 日付       | 概要                         |
|----|----------|----------------------------|
| 1  | 20040627 | 6番館の入口扉錆の件                 |
| 2  | 20040725 | 掲示板改善                      |
| 3  | 20040801 | 3番館共用水栓のハンドル修理             |
| 4  | 20040801 | 6.7番館の屋上の状況と清掃を実施          |
| 5  | 20040829 | 集会所階段の手摺増設工事               |
| 6  | 20040905 | 車止めブロック補修箇所確認／ハンドル修理       |
| 7  | 20040912 | 車止めブロック補修完了                |
| 8  | 20040924 | 4番館4-1共用水道金具の部分破損の補修       |
| 9  | 20041010 | 集会所階段の手摺の受け金具増設による補強       |
| 10 | 20041017 | オーディオラックの調達および設置           |
| 11 | 20041031 | オーディオラックの配線整理，4番館： 邸アルミ扉補修 |

写真 6 : 5-3 掲示板

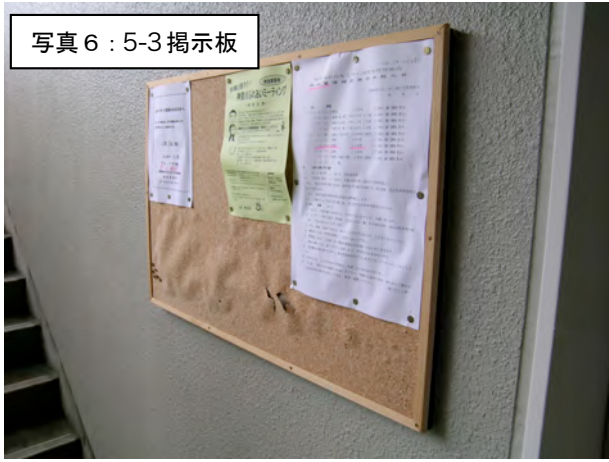


写真 7 : 1-4 掲示板



- 4 番館の掲示板で膨らんでいた所は乾燥して直ったようだ.
- 管理人はこの状態でも掲示業務に支障は無いと言っている.
- 裏返せば使えるだろう.
- 同じ物はカインズホームには無かった.

写真 8 : 2-2 掲示



#### 今後の活動予定 :

1. プロジェクタへの暖房風よけ設置は, 次回以降の活動日に実施予定 (11/14?)
2. 6 番館北東通路のインターロック補修は, 11/14(日)に実施予定.
3. 集会所事務所の書類整理のための, 棚増設は 11/28(日)実施予定.
4. 上記 2 件のための材料調達を 11/7 に実施予定.

#### (参考) 未依頼／未実施の案件 :

1. 自転車／バイク置き場のアルミ横バーの不具合対処
2. 掲示板コルクボードの保護塗装
3. 集会所 2 階南面ベランダの電源ボックスの錠前不良
4. パソコン室内の整理

以上

【2004.10.16 要望書(4 番館 一 殿)】

《具体的内容》

ポーチ入口のアルミ製の扉が斜めに歪んでしまっています。入居時（五年前）より気になっていたのですが、共用部分ということで手を付けないでいました。一部ねじもなくなっています。今回D I Yの方とお話しする機会があり要望書を提出させていただきました。お手数ですがご検討お願い致します。

※理事会よりD I Yクラブへ工事依頼 → 10/31 分解～補修～再組立て～調整により修理完了  
D I Yクラブのみなさまありがとうございました。



『修理前』



『修理後』



『修理中(集会所にて)』



『調整中(玄関先にて)』

玄関アルミ扉組み図  
(4- バラシ) 2004. 10.31

